



Таймлайн 2020 (презентація для майданчиків): May edition

Інформація про таймлайн


1. Таймлайн попередній, частина дедлайнів закріплена в нормативно-правових актах і не може бути посунута, частина - з можливістю посунути +/- на 1-2 місяці
 - a. Розробка - Розробка на стороні ЦБД
 - b. Майданчики - Розробка на стороні майданчиків
 - c. Тестування - Тестування майданчиків з боку ДП
2. Відображено час від початку розробки у на тестовому середовищі майданчика, до початку роботи перших майданчиків на продуктиві з публікацією процедур, заяв на участь та роботою з кваліфікацією
3. Відображено середній час розробки на майданчиках, з урахуванням того, що в більшості майданчиків наявних ресурсів вистачає для послідовного запуску процедур, лише частину розробки можливо вести паралельно
4. Окремо відображено тестування на майданчиках, середня тривалість тестування однієї процедури на майданчику - 0.5-2 людино-тижні, залежно від складності процедури і якості майданчика. З наявними ресурсами (4 людини, які безпосередньо займаються тестуванням) на тестування всіх майданчиків по певному напрямку необхідно витратити від 1.5 до 6 тижнів
5. Частину розробки на стороні ЦБД буде можливість вести паралельно
6. Після готовності процедури на стороні ЦБД, "швидкі" майданчики першими підключаються до процедури і ми починаємо тестувати ці майданчики. Паралельно "повільні" майданчики завершують розробку і ми переходимо на їх тестування, в цей час "швидкі" майданчики вже займаються розробкою наступних процедур
7. Бажано щоб 80-90% майданчиків, які планують працювати за конкретним напрямом, вкладались в цей таймлайн і в нас не було великої кількості майданчиків які не дотримуються такого плану. Це призведе до розсіювання ресурсів ДП та розробників (консультаційна підтримка) та тестувальників (необхідність перемикатись між різними напрямками роботи)

Таймлайн на 2020

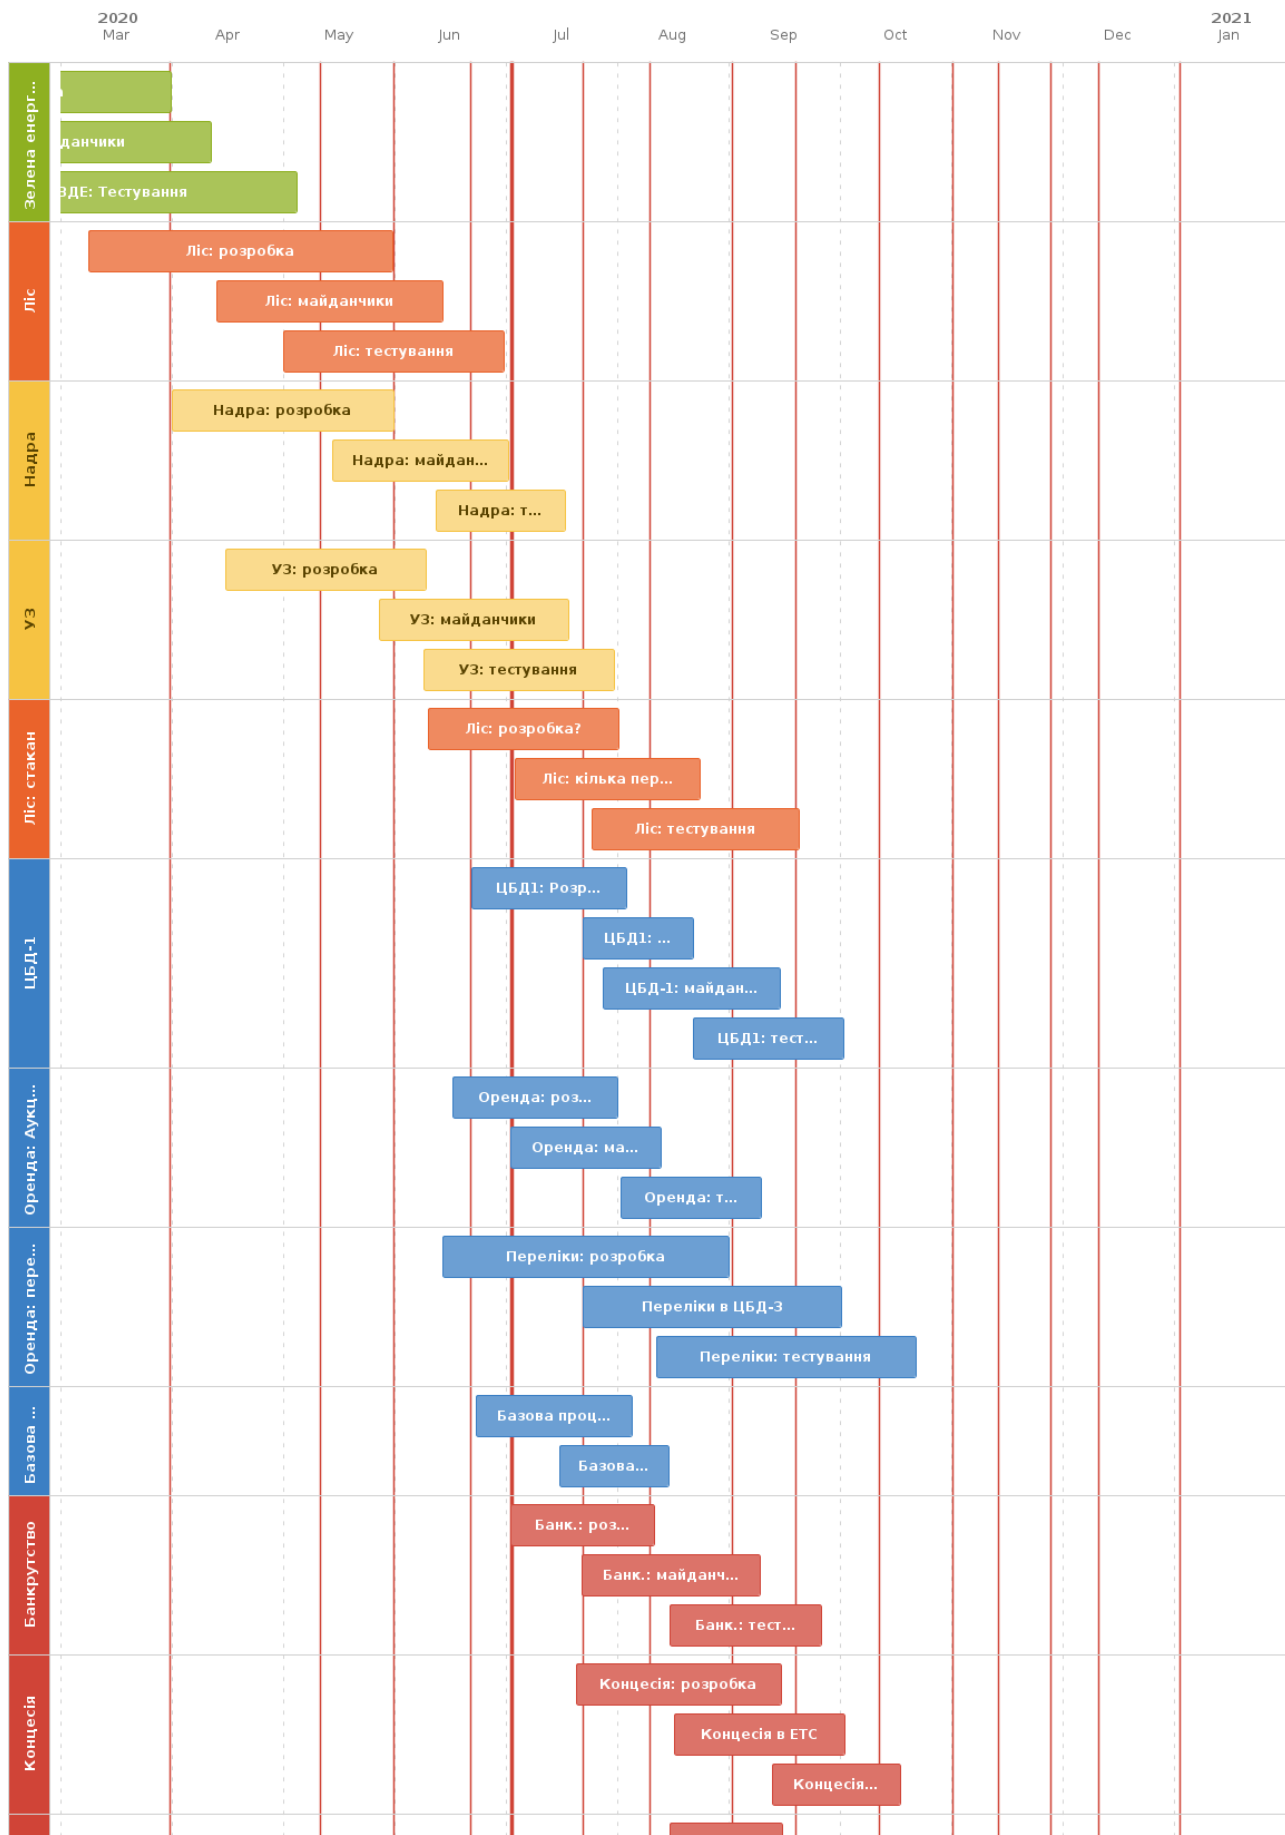

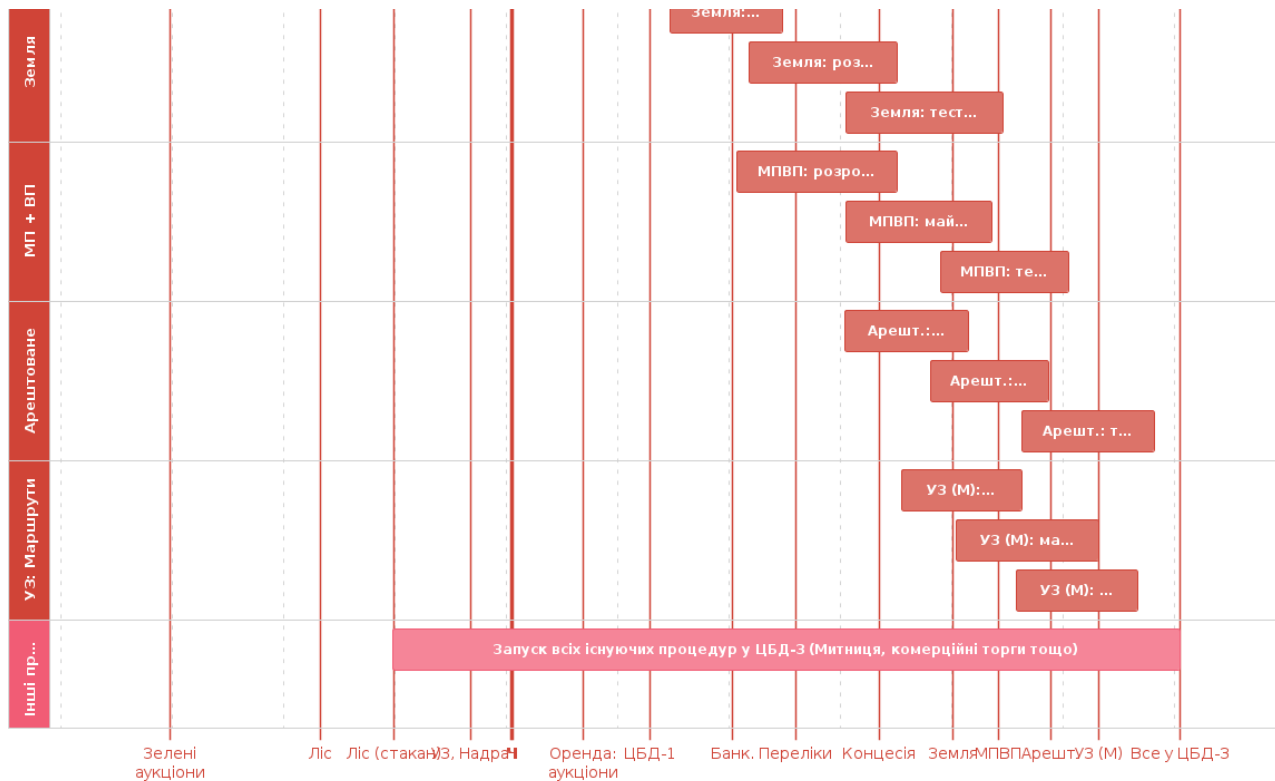

Таймлайн на другу половину 2020 (попередня версія, актуальність залежить від реалізації поточних планів та донорського фінансування)

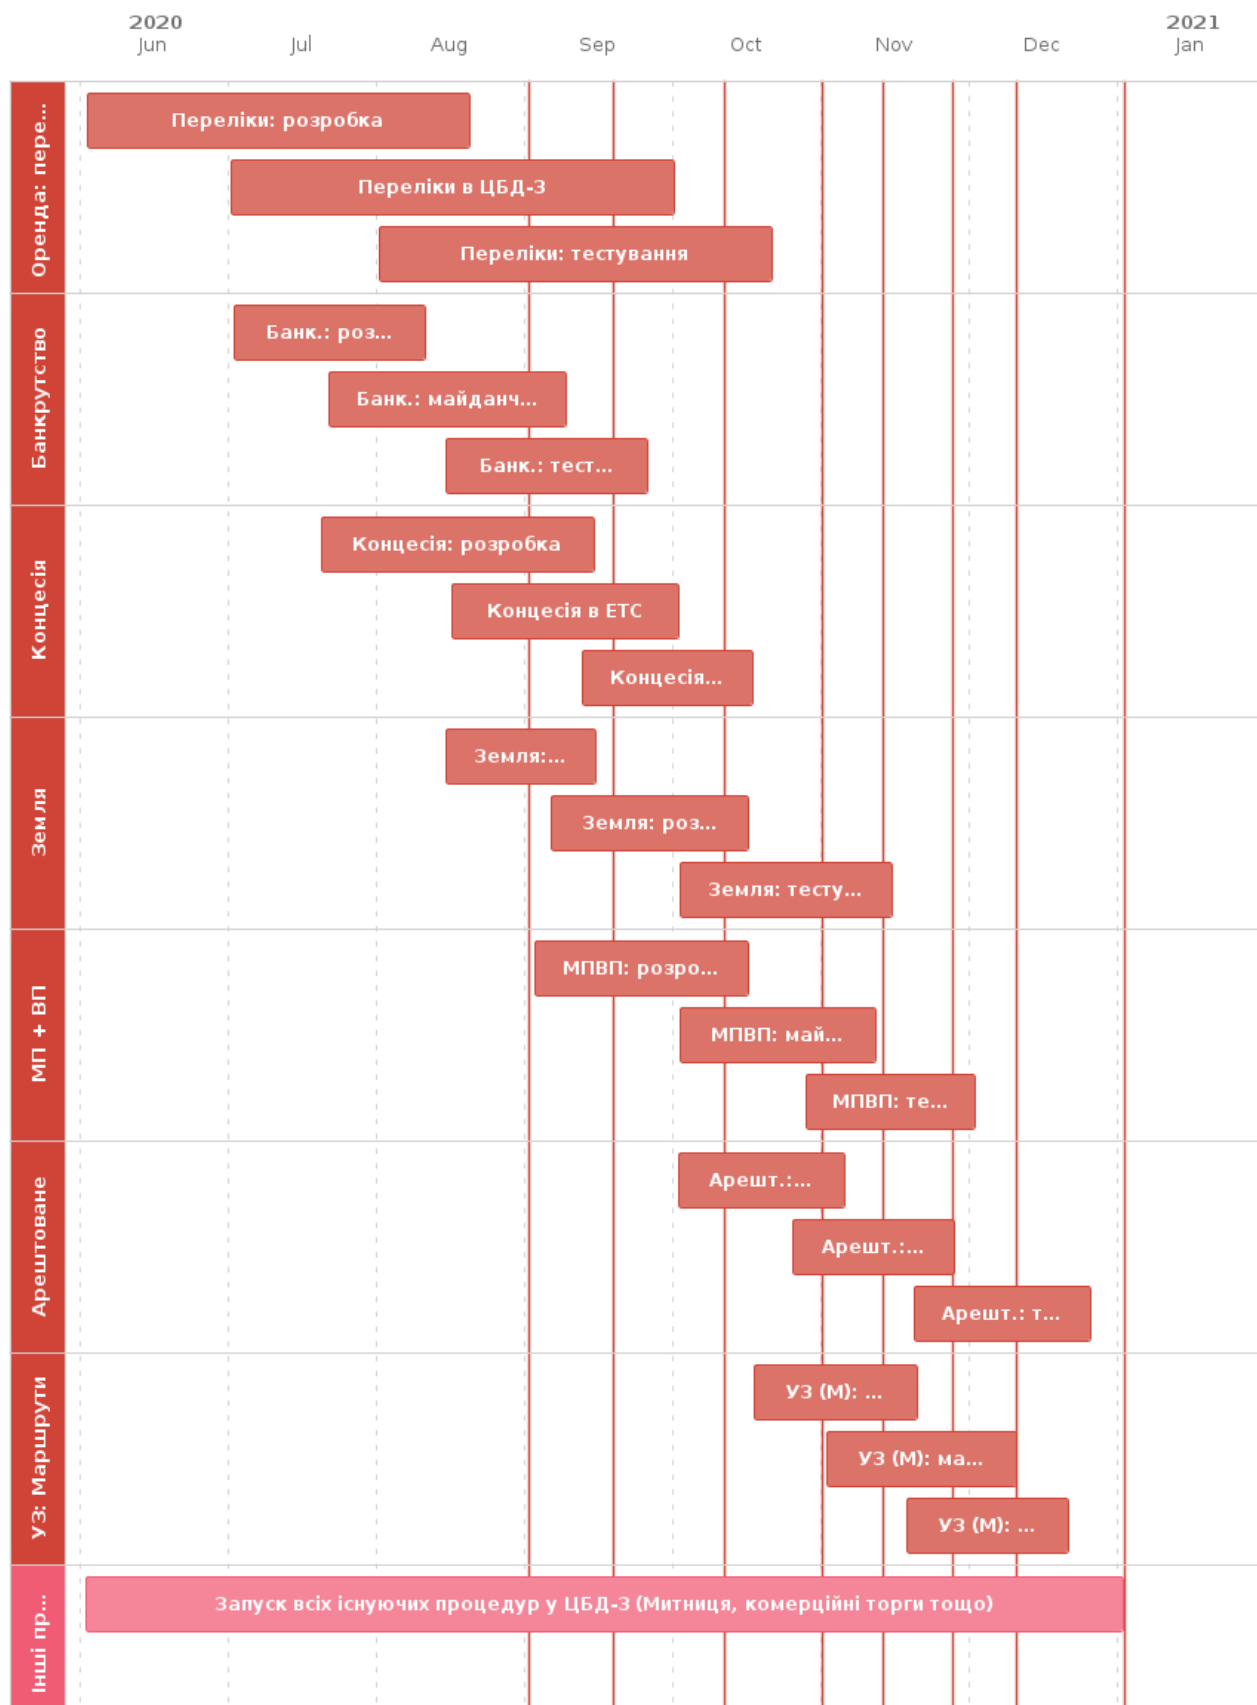

Банк. Переліки Концесія Земля МПВП Арешт УЗ (М) Все у ЦБД-3

